

---

# **ENTSCHEIDUNGS- VORLAGE:**

## **AUFSTELLUNG ERNE-SCHULE**

## ALBRECHT-DÜRER-SCHULE, WEITERSTADT

### Aktuelle Situation

Weiterstadt ist eine wachsende Kommune. Es ist beabsichtigt, an der Albrecht-Dürer-Schule eine weitere Schule zu errichten, in der zwei Schulsysteme (eine inklusive Ganztagsgrundschule und die Förderschule) sukzessive zusammenwachsen sollen.

Weiterhin ist ein Neubau für die Sek II geplant.

Auf dem Gelände der Astrid-Lindgren-Schule soll zeitnah eine Erweiterung stattfinden bzw. ein Ersatzneubau errichtet werden. Dafür wird eine Ersatzschule an anderer Stelle benötigt.

Die Schülerzahlenentwicklung in Weiterstadt erfordert dringendes Handeln für ein Ausweichquartier.

### Standort

Erne-Schule

Dr. Horst Schmidt Halle



Albrecht-Dürer-Schule (ADS)

Grundstück

Anna-Freud-Schule (AFS)

### Terminplan / Planungsablauf

- » ca. Januar - ca. April 2020  
Die Modulschule wird aufgebaut. Bis Sommer 2020 ist das Gebäude nutzbar und die Außenanlagen fertiggestellt.
- » Sommerferien 2020  
Die Astrid-Lindgren-Schule (ALS) kann ins EG und 1. OG der Ersatzschule umziehen. Im 2. OG findet die ADS geeignete 7 Räume um ihr Raumproblem zu mildern.
- » ab Mitte 2020  
Die Planung für den Erweiterungsbau an der ALS in Braunshardt kann beginnen
- » ca. Sommer 2023  
Die ALS zieht an ihren sanierten Standort zurück. Die AFS zieht in die freigewordenen Räume der Ersatzschule. Das Gebäude der AFS kann abgebrochen werden, um hier Platz zu schaffen für den modularen Neubau der Grundschule.
- » ca. Sommer 2024  
Nach Fertigstellung der neuen Grundschule bietet die Ersatzschule zunächst Platz für die Sek II. Im Rahmen der Campusplanung kann dann entschieden werden, wie und wo es mit der Sek II weiter geht.

### Vorteile / Nachteile

- + zeitnahes Ausweichquartier für ALS, deren Standort bei steigenden Schülerzahlen nicht mehr weiterentwickelt werden kann (kein Platz für weitere Interimslösungen)
- + die Baumaßnahme an der ALS kann ohne Störungen im Schulbetrieb abgewickelt werden
- + lange Standzeit durch kontinuierliche Nutzungen

## ERNST-REUTER-SCHULE, GROSS-UMSTADT

### Aktuelle Situation

An der Ernst-Reuter-Schule ist eine Neubaumaßnahme mit Teilsanierung geplant. Die Planung befindet sich derzeit in der Lph 1+2. Es ist vorgesehen in max.

zwei Bauabschnitten die Baumaßnahme abzuwickeln. Eine Interimslösung wird frühestens benötigt, wenn die Baumaßnahme beginnt.

### Standort

Abriss ERS und  
Standort Neubau

Sporthalle

Sportanlagen



Grundstück

Erne-Schule und  
mögliche  
Erweiterungsfläche

### Terminplan / Planungsablauf

- » ca. Januar - ca. April 2020  
Die Modulschule wird aufgebaut..
- » ca. Sommer 2021  
voraussichtlicher Beginn der Baumaßnahme, 1. BA
- » ca. 2024  
voraussichtliche Fertigstellung der Baumaßnahme.  
Die Ersatzschule zieht an neuen Standort.

### Vorteile / Nachteile

- Ein Jahr Leerstand der Erne-Schule
- Sportanlagen stehen früher und damit länger als nötig nicht zur Verfügung.


## TANNENBERGSCHULE, SEEHEIM

### Aktuelle Situation

An der Tannenbergsschule ist eine Neubaumaßnahme geplant. Die Lph 0 ist abgeschlossen. Das Vergabeverfahren für den Generalplaner ist derzeit ausgeschrieben. Es ist vorgesehen, die komplette Schule auszulagern und

an der Stelle des Bestandsgebäudes einen Neubau zu errichten. Eine Interimslösung wird frühestens benötigt, wenn die Baumaßnahme beginnt.

### Standort

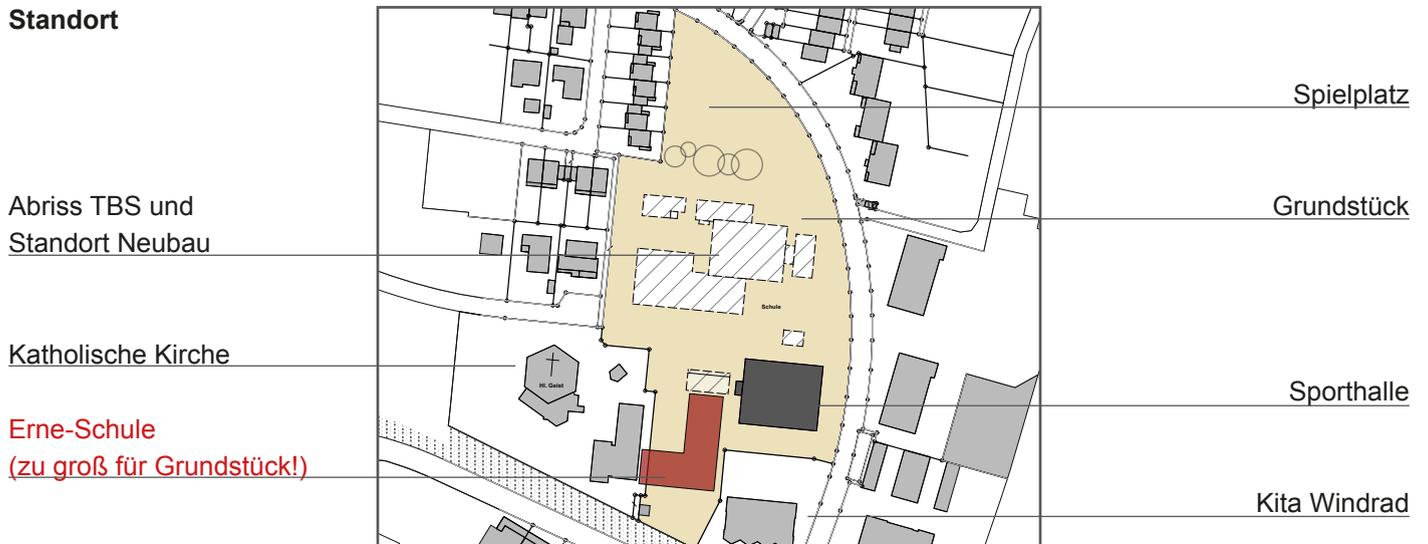

### Terminplan / Planungsablauf

- » ca. 2021  
voraussichtlicher Baubeginn

### Vorteile / Nachteile

- Die Erne-Schule kann aufgrund ihrer Abmessungen auf der zur Verfügung stehenden Fläche nicht aufgestellt werden.


## CARLO-MIERENDORFF-SCHULE, GRIESHEIM

### Aktuelle Situation

An der Carlo-Mierendorff-Schule (CMS) ist eine Neubau-  
maßnahme geplant. Der Architekt wurde über einen  
Wettbewerb ausgewählt.

Es ist vorgesehen, die Schule in Teilen auszulagern.  
Eine Interimslösung wird frühestens benötigt, wenn die  
Baumaßnahme beginnt.

### Standort

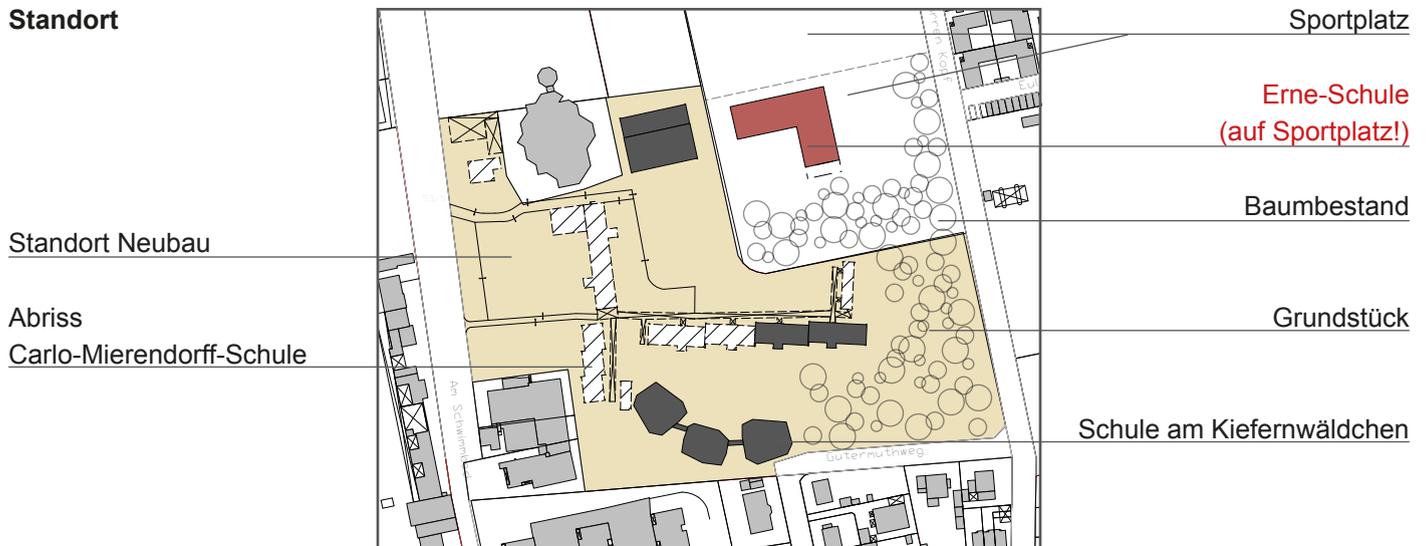

### Terminplan / Planungsablauf

- » ca. Januar - ca. April 2020  
Die Modulschule wird aufgebaut..
- » ca. Sommer 2021  
voraussichtlicher Beginn der Baumaßnahme
- » ca. 2023  
voraussichtliche Fertigstellung der Baumaßnahme.  
Die Ersatzschule zieht an neuen Standort.

### Vorteile / Nachteile

- Es müsste geklärt werden, ob der Sportplatz für diese Interimslösung zur Verfügung stünde.
- Diese Klärung ist nicht zeitnah herbeizuführen.
